

晨间交接

4名操作员合计闲置时间5%。 合计素材估算成本¥311。

开工前 / 建议

- 07:00 工长：预订物料吊运时段；指定一名跑腿。
- 07:10 仓管：清点袋数；备好第一批。
- 07:15 班组长：标出作业区；检查第一个完工单元。

9时56分

素材总时长

9时22分

可见作业

4.9%

实测闲置占比

¥155

潜在节省 / 估算

安全提示 / 开工前复核

已链接来源 / 工长复核




待复核

潜在绊倒风险

通道上有杂物。工长：开工前检查并清理通道。

室内装修 · 片段 001 | 00:07-00:14



待复核

高处作业

画面中有脚手架作业。工长：安排检查脚手架和防坠落措施。

外墙涂装 · 片段 001 | 00:00-00:06



待复核

焊接 / 动火作业

画面中有焊接。工长：复工前检查防护装备和防火措施。

混凝土作业 · 片段 001 | 00:56-01:00

今日行动台 / 建议分工

01 / 延误

起草延误通知

全队合计28分钟的闲置画面需要复核。先确认链接等待的原因，再准备一份注明损失时间、责任方和原始片段的通知。工长审核后再发送。

水泥作业 · 片段 038 | 00:36-00:57

04 / 进度

追回落后的一天

演示计划：按当前速度第6天完工，目标是第5天。各班组日进度从10个百分点提高到12个。工长确认班组产能后下达修订的日目标。

02 / 人工与结算

把工时变成账单

4名操作员共9小时22分可见作业。加入已批准的考勤和费率，按每人一行、附链接证据准备账单。工长审批总额。

05 / 培训

做一节一分钟的课

把涂装画面拆成三步：准备、施工、检查。工种负责人核对方法后，用原始片段和首件检查表给下一位操作员上一节短课。

外墙涂装 · 片段 001 | 00:06-00:16

03 / 材料

中午前订购8袋

演示计划：12袋，每天用4袋，第5天到货。就近预留8袋补缺口。仓管核实数量；工长批准提货单。

室内装修 · 片段 001 | 00:30-00:33


06 / 错误记忆

砌高之前先检查


用墙体对线片段建立一个拉线找平检查点。班组长在砌下一皮之前检查第一皮。若确认缺陷，记录原因和修正方法，供下一面墙使用。

砌筑作业 · 片段 001 | 00:08-00:14

各操作员用时 / 实测

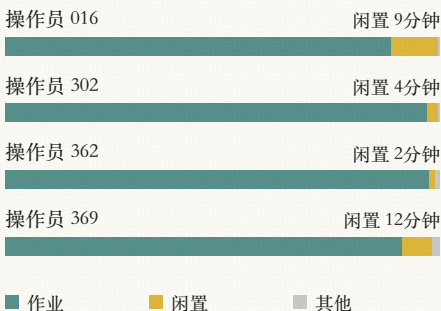

库存 / 计划情景



完工 / 计划情景

